

Bautagesbericht Nr. 1

System-Nr. TB-2026-0001

Dienstag, 8. September 2026

BAUVORHABEN Kanalbau Musterstraße, Bauabschnitt 2		BERICHTSTAG 08.09.2026 · KW 37	VORARBEITER Brandt
ORT Musterstraße 40, 12345 Musterstadt	ARBEITSZEIT 07:00 – 14:30 Uhr · 30 Min. Pause	WITTERUNG 14,5 °C, 6,2 mm Niederschlag Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0) · Tageswert für Musterstraße 40, 12345 Musterstadt, automatisch ermittelt	NETTO-ARBEITSZEIT 7 Std.

1 AUSGEFÜHRTE TÄTIGKEITEN

Rohrverlegung im Bauabschnitt 2 fortgesetzt: Rohrgraben von Station 0+120 bis 0+165 mit dem Bagger ausgehoben und mit Grabenverbau gesichert. 45 m Kanalrohr DN 300 verlegt, Gefälle mit Rotationslaser kontrolliert, Rohrleitungszone mit Sand eingebettet und lagenweise verdichtet. Hausanschlussschacht bei Haus Nr. 44 gesetzt. Ab 13 Uhr Regen — Arbeiten im offenen Graben eingestellt, Graben mit Planen abgedeckt, Restzeit für das Aufräumen des Lagerplatzes und die Reinigung der Geräte genutzt.

Regiearbeiten: keine

2 ANWESENDE

QUALIFIKATION	ANZAHL	STUNDEN	PAUSE	NETTO
Vorarbeiter	1	7 Std.	30 Min.	6,5 Std.
Facharbeiter	2	7 Std.	30 Min.	6,5 Std.
Gesamt	3	21 Std.	–	19,5 Std.

3 MASCHINENEINSATZ

MASCHINE	STUNDEN
Bagger (Kettenbagger 8 t)	4,5 Std.
Rüttelplatte	1,5 Std.

4

BESONDERE VORKOMMNISSE

Ab 13 Uhr anhaltender Regen, Grabenarbeiten aus Sicherheitsgründen eingestellt. Anlieferung Kanalrohre DN 300 (36 m) für morgen angekündigt.

5

FOTODOKUMENTATION


SYMBOLFOTO (Demo) – Rohrgraben mit Verbau



Foto

01

SYMBOLFOTO (Demo) – Bagger am Graben

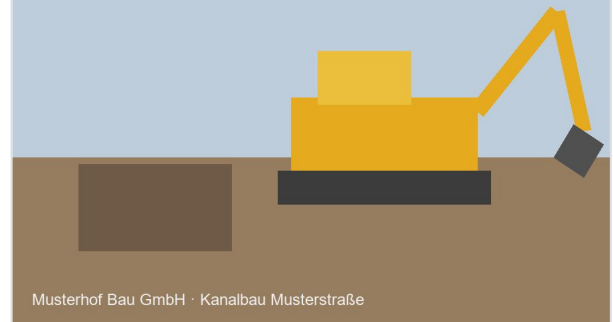

Foto

02

Brandt

Unterschrift Vorarbeiter
